



Dagböcker från:

# 25075 - Gubbtäppevägen 18 VA och väg

Perioden: 2025-10-01 - 2025-10-31

## Pågående/påbörjade arbeten

På etablerat, haft byggmöte med kund, grävt ur och fram för vatten avlopp el och fiber

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Gick igenom jobbet med kund. Etablerade grävmaskinen. Började gräva fram vatten och avloppsanslutningen nere vid vägen. Stötte på både fiber och nått stort betongrör. Tog ca 10minuter per skopa att lasta bort det högst upp på tomten. Började istället att Gräva ur och plocka bort Ölands stenar åt grannen och invänta dumper till imorgon.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Avvikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tilläggsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder





På etablerat, haft byggmöte med kund, grävt ur och fram för vatten avlopp el och fiber



Gick igenom jobbet med kund. Etablerade grävmaskinen. Började gräva fram vatten och avloppsanslutningen nere vid vägen. Stötte på både fiber och nått stort betongrör. Tog ca 10minuter per skopa att lasta bort det högst upp på tomten. Började istället att Gräva ur och plocka bort Ölands stenar åt grannen och invänta dumper till imorgon.

## Pågående/påbörjade arbeten

Grävt fram avlopp och inkommande vatten, kört bort massor med dumper

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

schaktade vidare och lastade på dumpern. Kom ner till berget. frilade närmare vägen för att hitta VA anslutningen. Fick handgräva fram till spolbrunnen för att hitta anslutningen. åkte och köpte rör på Lunda. Kom tillbaka och kopplade på ledningen fram ca 1m för att sedan kunna fylla upp under vägen igen och packa ordentligt.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Avvikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tilläggsarbeten

## Närvarotid


Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder



Grävt fram avlopp och inkommande vatten, kört bort massor med dumper



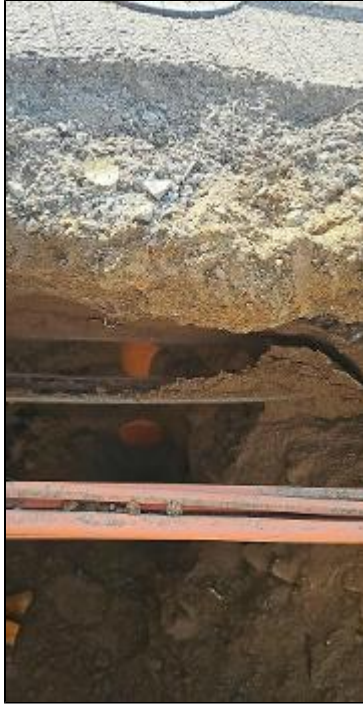



schaktade vidare och lastade på dumpern. Kom ner till berget. frilade närmare vägen för att hitta VA anslutningen. Fick handgräva fram till spolbrunnen för att hitta anslutningen. åkte och köpte rör på Lunda. Kom tillbaka och kopplade på ledningen fram ca 1m för att sedan kunna fylla upp under vägen igen och packa ordentligt.

### Pågående/påbörjade arbeten

schaktade vidare upp för backen. lastade på dumpern. Schaktade även ur för nya vägen. kom ner på berg för VA vid 75cm djup. Fiber som är ivögen tar extra tid med försiktig grävning. Grävde ca 15m. Trädfällare kom ut och fyllde 2st träd som jag fick ta hand om och lägga på hög på sidan.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

Grävt upp för vatten avlopp fiber och el, kört med dumper och dumpat material

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

### Avslutade arbeten

### Avvikelser / Störningar / Hinder

### Ändringar och tilläggsarbeten

### Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	6
Totalt:	14

### Bilder





schaktade vidare upp för backen. lastade på dumpern. Schaktade även ur för nya vägen. kom ner på berg för VA vid 75cm djup. Fiber som är ivögen tar extra tid med försiktig grävning. Grävde ca 15m. Trädfällare kom ut och fyllde 2st träd som jag fick ta hand om och lägga på hög på sidan.





Grävt upp för vatten avlopp fiber och el, kört med dumper och dumpat material

## Pågående/påbörjade arbeten

Fortsatte schakta upp för backen. Grävde förbi tegelvillan. Grävde sedan upp stubbarna. tog tid. 0.8 stenmjöl kom men lastbilen kunde inte backa upp. Vi fick köra runt och ner och lastade dumpern ifrån lastbilen och tippa där uppe. Leverans med alla rör kom. Kopplade sedan in vatten rören och grenade isär dom för 2 fastigheter. kopplade på avstängningsventil på båda 32 slangarna.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Awikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tilläggsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder









Fortsatte schakta upp för backen. Grävde förbi tegelvillan. Grävde sedan upp stubbarna. tog tid. 0.8 stenmjöl kom men lastbilen kunde inte backa upp. Vi fick köra runt och ner och lastade dumpern ifrån lastbilen och tippa där uppe. Leverans med alla rör kom. Kopplade sedan in vatten rören och grenade isär dom för 2 fastigheter. kopplade på avstängningsventil på båda 32 slangarna.

## Pågående/påbörjade arbeten

Kopplat på vatten och avlopp, mont spolbrunnar vatten avstängare, fyllt med stenmjöl, grävt upp schakt, sandat i schakt

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Grävt upp schakt för avlopp vatten el fiber, dumpat massor, kört upp stenmjöl

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Grävde upp stubben som satt som satan i berget. komunen kom ut och kollade på anslutningen på VA och startade igpng vattnet fram till våra nya ventiler så vi sedan kan kontrollera nya rören upp och starta och stänga av vattnet som vi vill. Kopplade sedan in grenen till avloppet. Monterade fram och monterade 2st spolbrunnar för vardera fastighet. Monterade förminskning 160-110. pluggade båda 110 rören tillsvidare. monterade även betäckningarna till spolbrunnarna. försökte fylla med sand i schaktet och skulle köra med vardera larver på varsin sidan om hålet. Fick inte tyvärr då det regnat hela natten och jag bara gled omkring. Fyllde dumpern med 0.8 stenmjöl. Körde sedan runt ifrån andra hållet och fyllde fast Vatten rören och avloppsrören. Fyllde även upp under vägen och packade. samt skyddsfyllde el och fiber som kommit fram i gatan. Städade gatan för att en granne gnälld på några ler kluttar. åkte sedan upp igen. Tog stenmjöl i skopan. Stoffe fick lägga ut det för hand i hela schaktet med spaden. Schaktade sedan vidare upp för backen. Stötte nu på berg som bara ligger 10cm under jorden. Frilade berget lite bredare. Soppade rent berget. ca 6m långt sen gick det tvärt ner igen till vårt tidigare schakt djup. sen direkt efter började berget gå upp igen. Börjar bli fullt med schaktmassor där uppe så vi måste börja lämpa undan massor så vi kan tippa mera.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Awikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tillägsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder





Kopplat på vatten och avlopp, mont spolbrunnar vatten avstängare, fyllt med stensmjöl, grävt upp schakt, sandat i schakt

---







Grävt upp schakt för avlopp vatten el fiber, dumpat massor, kört upp stenmjöl

---









Grävde upp stubben som satt som satan i berget. komunen kom ut och kollade på anslutningen på VA och startade igpng vattnet fram till våra nya ventiler så vi sedan kan kontrollera nya rören upp och starta och stänga av vattnet som vi vill. Kopplade sedan in grenen till avloppet. Monterade fram och monterade 2st spolbrunnar för vardera fastighet. Monterade förminskning 160-110. pluggade båda 110 rören tillsvidare. monterade även betäckningarna till spolbrunnarna. försökte fylla med sand i schaktet och skulle köra med vardera larver på varsin sidan om hålet. Fick inte tyvärr då det regnat hela natten och jag bara gled omkring. Fyllde dumpern med 0.8 stenmjöl. Körde sedan runt ifrån andra hållet och fyllde fast Vatten rören och avloppsrören. Fyllde även upp under vägen och packade. samt skyddsfylldde el och fiber som kommit fram i gatan. Städade gatan för att en granne gnälld på några ler kluttar. åkte sedan upp igen. Tog stenmjöl i skopan. Stoffe fick lägga ut det för hand i hela schaktet med spaden. Schaktade sedan vidare upp för backen. Stötte nu på berg som bara ligger 10cm under jorden. Frilade berget lite bredare. Soppade rent berget. ca 6m långt sen gick det tvärt ner igen till vårt tidigare schakt djup. sen direkt efter började berget gå upp igen. Börjar bli fullt med schaktmassor där uppe så vi måste börja lämpa undan massor så vi kan tippa mera.

FÖRETAG

C.Sjögren Entreprenad AB

Dagbok

VECKA NR

41

ORT

PROJEKTNUMMER/PROJEKT

25075 - Gubbtäppevägen 18 VA och väg

VECKODAG

Torsdag

PPROJEKTANSVARIG

ARBETSPLATS

Christopher Sjögren

Gubbtäppevägen 18 VA och väg

ÅR - MÅNAD - DAG

2025-10-09

BESTÄLLARE

### Pågående/påbörjade arbeten

Grävt fram berg, kört bort massor, tagit emot material, lagt stenmjöl i schakt och jämnat ut, byggt frigolitlåda

Skrevet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Lämpade bort massor för att kunna lasta av mer schaktmassor med dumpern. Material med frigolit lådor och värme kabel kom. Grävt fram berget. Monterat botten och väggar till friggolit lådan ca 30m.

Skrevet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

### Avslutade arbeten

### Avvikelser / Störningar / Hinder

### Ändringar och tilläggsarbeten

### Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

### Bilder







Grävt fram berg, kört bort massor, tagit emot material, lagt stenmjöl i schakt och jämnat ut, byggt frigolitlåda







Lämpade bort massor för att kunna lasta av mer schaktmassor med dumpern. Material med frigolit lådor och värme kabel kom. Grävt fram berget. Monterat botten och väggar till frigolit lådan ca 30m.

## Pågående/påbörjade arbeten

Dragit el rör, fibernät , avloppsrör

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Drog upp avloppsrören och el och fiber rören i schaktet. Borrigen kom ut. körde upp riggen. ställde upp den. började borra. borrarde 5 hål sen gick borrarigen sönder. borrarde totalt med etablering 2 timmar. 2 timmar rör dragning. fyllde ut schaktmassorna. Plattade till det med larverna. 2tim. stillestånd 2 timmar.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Avvikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tilläggsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder





Dragit el rör, fibernät , avloppsrör





Drog upp avloppsrören och el och fiber rören i schaktet. Borriggen kom ut, körde upp riggen, ställde upp den, började borra. borrarade 5 hål sen gick borriggen sönder. borrarade totalt med etablering 2 timmar. 2 timmar rör dragning. fyllde ut schaktmassorna. Plattade till det med larverna. 2tim. stillestånd 2 timmar.

## Pågående/påbörjade arbeten

Lagt armering, fyllt ut mot Lstöd, lagt fiberduk, paddat

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Hämtat spräckutrustning, samt material, börjat spräcka berg

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Fortsatte borra. borrade ca 10 hål sen la borrhjuggen av och varnade för motor fel. Stoffe spräckte alla hål. sen åkte han på annat jobb. grannen kom ut och sa att det var ok att gena lite över hans tomt till Bengts tomt då vi sparade väldigt mycket berg jobb på det. Schaktade fram lite mer in på Bengts tomt. Kom ner på ca 80cm i slutet. Lastade bort massorna och plantage ut dom på platån. rev sedan berget som vi hade spräckt. högade upp berget på platån längst in för att få plats med så mycket som möjligt. Stubben som var fast i berget där kunde jag nu få bort när berget var ur vägen. Kom in mer material till friggolit lådan. beställde lastbil till imorgon med kross och stenhjul. Grävde sedan fram anslutningarna till dagvattenröret i marken som vi grävde bort tidigare för att kunna skarva ihop det med plaströr imorgon. Jag kopplade in vattenrören i service ventilerna upp mot huset. Stoffe köper grejer till imorgon för att provtrycka båda 32 slangarna. och laga dagvattenröret. samt lite isolering osv. elektriker kommer ut imorgonbitti och fixar värmekabeln.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Avvikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tilläggsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	4
Totalt:	12

## Bilder



Hämtat spräckutrustning, samt material, börjat spräcka berg





Fortsatte borra. borrade ca 10 hål sen la borrhjulen av och varnade för motor fel. Stoffe spräckte alla hål. sen åkte han på annat jobb. grannen kom ut och sa att det var ok att gena lite över hans tomt till Bengts tomt då vi sparade väldigt mycket berg jobb på det. Schaktade fram lite mer in på Bengts tomt. Kom ner på ca 80cm i slutet. Lastade bort massorna och plantage ut dom på platån. rev sedan berget som vi hade spräckt. högade upp berget på platån längst in för att få plats med så mycket som möjligt. Stubben som var fast i berget där kunde jag nu få bort när berget var ur vägen. Kom in mer material till friggolit lådan. beställde lastbil till imorgon med kross och stensmjöl. Grävde sedan fram anslutningarna till dagvattenröret i marken som vi grävde bort tidigare för att kunna skarva ihop det med plaströr imorgon. Jag kopplade in vattenrören i service ventilerna upp mot huset. Stoffe köper grejer till imorgon för att provtrycka båda 32 slangarna. och laga dagvattenröret. samt lite isolering osv. elektriker kommer ut imorgonbitti och fixar värmekabeln.

## Pågående/påbörjade arbeten

Fixat dagvatten rör, mont värmekabel på vatten rör, fyllt upp med stenmjöl runt div rör, fixerat brunnar för spolbrunnar och av/på vatten, paddat och lagt ut material för väg

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Elektrikern kom ut och kopplade värme kabeln. Vi provtryckte båda 32 pem slangarna med proppar i slutet för att kontrollera att allt var tätt. Vi monterade sedan värmekabeln på pem slangen med stripes ca cc30. Monterade isolering runt röret ifrån serviceventilen upp till lådan som extra skydd där man inte kan montera låda. Monterade även värme kabeln ifrån service ventilen och upp. Fyllde fast med 0.8 stenmjöl som lastbilen kom med. lastbilen ställde av kontainern och åkte och hämtade en annan kontainer. lastbilen kom tillbaka med 500kg padda och ett fullt lass med 0.63 kross. Vi paddade ytan i botten med rundpaddan. Fyllde upp till el nivån. fyllde runt spolbrunnarna och serviceventilerna med 0.8 stenmjöl hela vägen upp. Grävde ur lite mer för infarten och el och fiber uppsticket. Fyllde sedan fast dom med 0.8 stenmjöl både under och över. Monterade ihop betong röret igen med 200mm plast rör och betong till plast övergångar. Skydds fyllde sedan fiber kablarna i gatan med 0.8 stenmjöl samt den fibern som gick upp till kunden. paddade. La sedan på 0.63 kross för infarten. paddade infarten. Fyllde sedan fast lådan och elrören upp för backen så lång vi nådde. packade med fötterna bredvid och i lådan så gått det gick. Drog till ytan högst upp med kratta. la sedan locket på lådan. Fyllde fast locket med 5cm 0.8 stenmjöl och paddade med rund paddan. La sedan fiberduk. Fyllde ca 20cm kross på duken blev lite mer i mitten för schaktet ca 30 där. Tömde bilen på 0.63. Fyllde ut för vägen. paddade med 500kg paddan. skickade iväg lastbilen som lämnade tillbaka 500kg paddan på ramirent. Tömde sista stenmjölet och högade upp på nya vägen så lastbilen kunde ta sin andra kontainer också.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Awikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tilläggsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder









Fixat dagvatten rör, mont värmekabel på vatten rör, fyllt upp med stenmjöl runt div rör, fixerat brunnar för spolbrunnar och av/på vatten, paddat och lagt ut material för väg



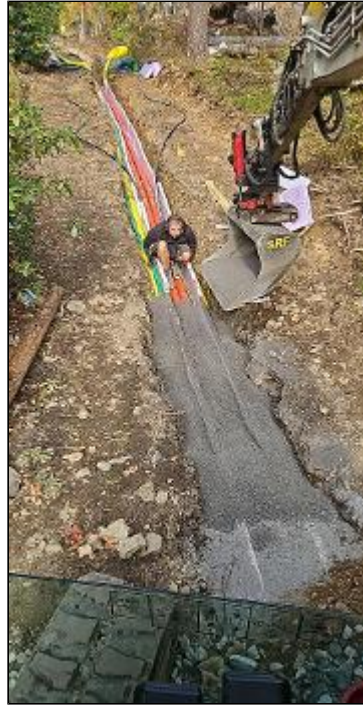





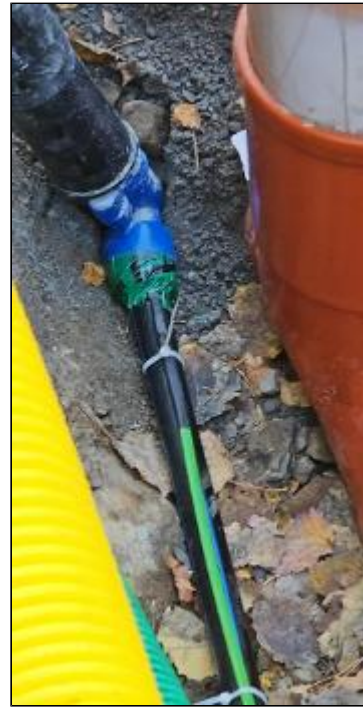

Elektrikern kom ut och kopplade värme kabeln. Vi provtryckte båda 32 pem slangarna med proppar i slutet för att kontrollera att allt var tätt. Vi monterade sedan värmekabeln på pem slangen med stripes ca cc30. Monterade isolering runt röret ifrån serviceventilen upp till lådan som extra skydd där man inte kan montera låda. Monterade även värme kabeln ifrån service ventilen och upp. Fyllde fast med 0,8 stenmjöl som lastbilen kom med. lastbilen ställde av containern och åkte och hämtade en annan container. lastbilen kom tillbaka med 500kg padda och ett fullt lass med 0.63 kross. Vi paddade ytan i botten med rundpaddan. Fyllde upp till el nivån. fyllde runt spolbrunnarna och serviceventilerna med 0.8 stenmjöl hela vägen upp. Grävde ur lite mer för infarten och el och fiber uppsticket. Fyllde sedan fast dom med 0.8 stenmjöl både under och över. Monterade ihop betong röret igen med 200mm plast rör och betong till plast övergångar. Skydds fyllde sedan fiber kablarna i gatan med 0.8 stenmjöl samt den fibern som gick upp till kunden. paddade. La sedan på 0.63 kross för infarten. paddade infarten. Fyllde sedan fast lådan och elrören upp för backen så lång vi nådde. packade med fötterna bredvid och i lådan så gått det gick. Drog till ytan högst upp med kratta. la sedan locket på lådan. Fyllde fast locket med 5cm 0.8 stenmjöl och paddade med rund paddan. La sedan fiberduk. Fyllde ca 20cm kross på duken blev lite mer i mitten för schaktet ca 30 där. Tömde bilen på 0.63. Fyllde ut för vägen. paddade med 500kg paddan. skickade iväg lastbilen som lämnade tillbaka 500kg paddan på ramirent. Tömde sista stenmjölet och högade upp på nya vägen så lastbilen kunde ta sin andra container också.



## Pågående/påbörjade arbeten

Borrat spräckt och rivit berg för väg

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Flyttade upp schaktmassorna som jag lagt temporärt hos Dan.

Fortsatte sedan att borra. borrade ca 100 hål. Stoffe spräckte alla hål. rev och rensade med grävmaskinen. Högade upp berget på platån längst bort.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Awikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tilläggsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder







Borrat spräckt och rivit berg för väg





Flyttade upp schaktmassorna som jag lagt temporärt hos Dan.

Fortsatte sedan att borra. borrade ca 100 hål. Stoffe spräckte alla hål. rev och rensade med grävmaskinen. Högade upp berget på platån längst bort.

### Pågående/påbörjade arbeten

Borrade ca 100 hål. Spräckte och rev med grävmaskinen vartefter. Gjorde väg fram för borrhjellen.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

Borrat, spräckt och rivit berg, fyllt med stenmjöl i schakt

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

### Avslutade arbeten

### Avvikelser / Störningar / Hinder

### Ändringar och tilläggsarbeten

### Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

### Bilder





Borrade ca 100 hål. Spräckte och rev med grävmaskinen vartefter. Gjorde väg fram för borrhjgen.







Borrat, spräckt och rivit berg, fyllt med stenmjöl i schakt

FÖRETAG

C.Sjögren Entreprenad AB

Dagbok

VECKA NR

42

ORT

PROJEKTNUMMER/PROJEKT

25075 - Gubbtäppevägen 18 VA och väg

VECKODAG

Fredag

PPROJEKTANSVARIG

Christopher Sjögren

ARBETSPLATS

Gubbtäppevägen 18 VA och väg

ÅR - MÅNAD - DAG

2025-10-17

BESTÄLLARE

### Pågående/påbörjade arbeten

Borrat, spräckt och rivit berg

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Borrade ca 130 hål. Spräckte ca 1/4 och rev med grävmaskinen.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

### Avslutade arbeten

### Awikelser / Störningar / Hinder

### Ändringar och tilläggsarbeten

### Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

### Bilder





Borrat, spräckt och rivit berg



Borrade ca 130 hål. Spräckte ca 1/4 och rev med grävmaskinen.

## Pågående/påbörjade arbeten

Borrat, spräckt och rivit berg för uppfart

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Spräckte berget som vi borrade i fredags. Gick tungt för spräckaren. Fick riva efter varje rad med grävmaskinen. Dardan fick vi fetta om vartannat hål för att det var så hårt berg. Rev allt till lunch. Borrade sedan ca 30 hål. Spräckte och rev allt. Flyttade en hög med stenmjöl 0.8 för att få mer plats för bilarna.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Avvikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tillägsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder





Borrat, spräckt och rivit berg för uppfart







Spräckte berget som vi borrade i fredags. Gick tungt för spräckaren. Fick riva efter varje rad med grävmaskinen. Dardan fick vi fetta om vartannat hål för att det var så hårt berg. Rev allt till lunch. Borrade sedan ca 30 hål. Spräckte och rev allt. Flyttade en hög med stensmjöl 0.8 för att få mer plats för bilarna.

### Pågående/påbörjade arbeten

Borrade för vägen färdigt och spräckte berget samt rev. 3tim Borrigen fick olje läckage. Lossade slang och åkte till swedol och fixade en ny samt mer hydraulolja. Monterade nya slang. Fyllde på med hydraulolja. Stillestånd 2tim.

Borrade sedan igen schaktet för VA där det delar av sig mellan tomterna. Spräckte och rev. Gjorde väg längre fram i schaktet. borrade första klacken i schaktet. ca 80 hål totalt i Schaktet. 3 tim för schaktet.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

Borrat, spräckt och rivit för uppfart 3 Tim, en slang börja läcka på borrigen stillestånd 2 Tim, borrat spräckt för avlopp, vatten, fiber och el 3 tim

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

### Avslutade arbeten

### Awikelser / Störningar / Hinder

### Ändringar och tilläggsarbeten

### Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

### Bilder



Borrade för vägen färdigt och spräckte berget samt rev. 3tim Borrigen fick olje läckage. Lossade slang och åkte till swedol och fixade en ny samt mer hydraulolja. Monterade nya slangen. Fyllde på med hydraulolja. Stillestånd 2tim.  
Borrade sedan igen schaktet för VA där det delar av sig mellan tomterna. Spräckte och rev. Gjorde väg längre fram i schaktet. borrade första klacken i schaktet. ca 80 hål totalt i Schaktet. 3 tim för schaktet.





Borrat, spräckt och rivit för uppfart 3 Tim, en slang börja läcka på borrhjulen stillestånd 2 Tim, borrat spräckt för avlopp, vatten, fiber och el 3 tim

## Pågående/påbörjade arbeten

Borrat spräckt och rivit berg för isoleringslåda och dragit rör, el fiber vatten, bajs, byggt låda

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Stoffe spräckte hålen vi borrade igår för VA i schaktet. Rev allting med grävmaskinen. Gjorde väg ner fram för att kunna borra berget längst ner i schaktet. Körde fram. Borrade alla hål där. ca 30 hål. Skulle köra bort borrhjellen. körde då fast i leran pga regnet. Fick ta kätting på grävmaskinen och dra upp borrhjellen. Spräckte sedan alla hål. rev med grävmaskien kom ner på bra djup. Lastade sedan bort berget ur schaktet och lämpade det bortot. La sand i schaktet samt på sidan för att kunna montera vidare med friggolit lådan för hand. Lastade ur och lämpade bort till platån. Lite kvar att lasta bort imorgon.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Awikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tilläggsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder










Borrat spräckt och rivit berg för isoleringslåda och dragit rör, el fiber vatten, bajs, byggt låda





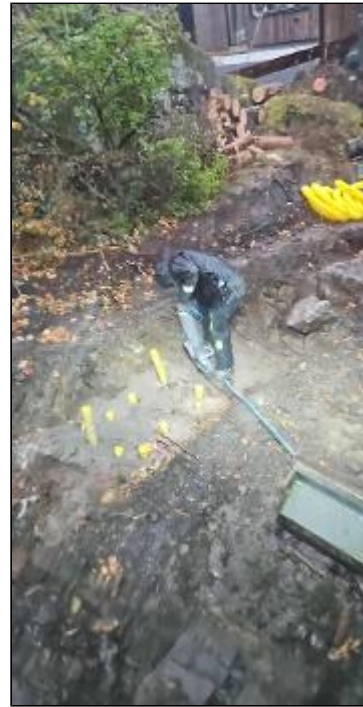

Stoffe spräckte hålen vi borrade igår för VA i schaktet. Rev allting med grävmaskinen. Gjorde väg ner fram för att kunna borra berget längst ner i schaktet. Körde fram. Borrade alla hål där. ca 30 hål. Skulle köra bort borrhjellen, körde då fast i leran pga regnet. Fick ta kätting på grävmaskinen och dra upp borrhjellen. Spräckte sedan alla hål. rev med grävmaskinen kom ner på bra djup. Lastade sedan bort berget ur schaktet och lämpade det bortot. La sand i schaktet samt på sidan för att kunna montera vidare med friggolit lådan för hand. Lastade ur och lämpade bort till platån. Lite kvar att lasta bort imorgon.

## Pågående/påbörjade arbeten

Borrat, spräckt och rivit för frigolitlåda rör för fiber el, vatten avlopp

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Skrapade fram mer berg där det viker av mellan fastigheterna. Fick borra lite mera för grannens instick för VA. Spräckte berget. Rev med grävmaskinen. schaktet upp för grannen är klart. Skrapade av berget vidare upp till Tony. Borrade och backen upp där vi har spräckt för vägen tidigare. Borriggen gick sönder efter ca 5 hål. en slang gick sönder. Den var lite står att ta bort då andra slangar var ivägen. Fick bort den till slut. Åkte och fixa en ny på swedol i Södertälje. Monterade tillbaka slangen. stillestånd 2h. Borrade sedan klart. Spräckte hålen och rev vartefter. Kom ner på bra djup längst ner. Skrapade fram mera berg enda fram tills det ska vika av 90 grader upp mot Tonys hus.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Awikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tilläggsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder





Borrat, spräckt och rivit för frigolitlåda rör för fiber el, vatten avlopp

---





Skrapade fram mer berg där det viker av mellan fastigheterna. Fick borra lite mera för grannens instick för VA. Spräckte berget. Rev med grävmaskinen. schaktet upp för grannen är klart. Skrapade av berget vidare upp till Tony. Borrade och backen upp där vi har spräckt för vägen tidigare. Borriggen gick sönder efter ca 5 hål. en slang gick sönder. Den var lite står att ta bort då andra slangar var ivägen. Fick bort den till slut. Åkte och fixa en ny på swedol i Södertälje. Monterade tillbaka slangen. stillestånd 2h. Borrade sedan klart. Spräckte hålen och rev vartefter. Kom ner på bra djup längst ner. Skrapade fram mera berg enda fram tills det ska vika av 90 grader upp mot Tonys hus.

## Pågående/påbörjade arbeten

Borrat spräckt rivit berg, byggt frigolit låda dragit rör vatten fiber och el

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Fortsatte borra sista biten innan 90gradarn upp till Tonys hus. Borrade allt. spräckte ca 40 hål. rev allt vartefter. väldigt inspänt och hårt. Lyckades bara komma ner 30cm. Rensade allt och borrade en vända till. Grävde ur leran runt hörnet för att se om det var mer berg där också. Borrade totalt ca 80 hål.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Avvikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tilläggsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder





Borrat spräckt rivit berg, byggt frigolit låda dragit rör vatten fiber och el





Fortsatte borra sista biten innan 90gradarn upp till Tonys hus. Borrade allt. spräckte ca 40 hål. rev allt vartefter. väldigt inspänt och hårt. Lyckades bara komma ner 30cm. Rensade allt och borrade en vända till. Grävde ur leran runt hörnet för att se om det var mer berg där också. Borrade totalt ca 80 hål.

## Pågående/påbörjade arbeten

Borrat spräckt och rivit berg för avlopp vatten el fiber  
Monterat frigolitlåda med div rör fyllt med stenmjöl

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Skrapade fram berget uppe vid huset. Fick leta efter avloppet litegrann. Kom ner på rätt djup en liten bit. sedan kom der berg ungefär vid entre dörren. Stoffe hamna i kö på morgonen och kom sent. Spräckte sista berget på begnts tomt. Rev vartefter med grövmaskien, kom ner på rätt djup där. Borrade sedan uppe vid huset. Skulle sedan spräcka men då funkade den inte så Kendrill fick komma ut med en ny speäckare. 1h stillestånd med berg. Fyllde då på med sand I rör graven för hand. Spräckte sedan berget med nya speäckaren. rev allting. Kom ner på bra djup direkt på dom 6m vi borrade och kom åt.

2h grävning för va på morgonen.  
1h rörförläggning under stillestånd.  
5h berg jobb.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Avvikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tilläggsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder





Borrt spräckt och rivit berg för avlopp vatten el fiber  
Monterat frigolitlåda med div rör fyllt med stenmjöl





Skrapade fram berget uppe vid huset. Fick leta efter avloppet litegrann. Kom ner på rätt djup en liten bit. sedan kom der berg ungefär vid entre dörren. Stoffe hamna i kö på morgonen och kom sent. Spräckte sista berget på begnts tomt. Rev vartefter med grövmaskien, kom ner på rätt djup där. Borrade sedan uppe vid huset. Skulle sedan spräcka men då funkade den inte så Kendrill fick komma ut med en ny speäckare. 1h stillestånd med berg. Fyllde då på med sand I rör graven för hand. Spräckte sedan berget med nya speäckaren. rev allting. Kom ner på bra djup direkt på dom 6m vi borrade och kom åt.

2h grävning för va på morgonen.  
1h rörförläggning under stillestånd.  
5h berg jobb.

## Pågående/påbörjade arbeten

Borrat spräckt berg och rivit för vatten avlopp el och fiber

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Borrade ca 6m direkt på morgonen. Spräckte alla hål. rev med grövmaskinen. Kom ner på bra djup. Grävde fram berget ca 6m till. Borrade. spräckte och sedan rev. Kom ner hyfsat blev en lång rygg i ett slag i berget. Fick borra sträckan en gång till. spräckte sedan och rev. Kom ner på bra djup. Schaktade sedan upp ca 6m till och borrade allting.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Avvikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tillägsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder





Borrat spräckt berg och rivit för vatten avlopp el och fiber







Borrade ca 6m direkt på morgonen. Spräckte alla hål. rev med grövmaskinen. Kom ner på bra djup. Grävde fram berget ca 6m till. Borrade. spräckte och sedan rev. Kom ner hyfsat blev en lång rygg i ett slag i berget. Fick borra sträckan en gång till. spräckte sedan och rev. Kom ner på bra djup. Schaktade sedan upp ca 6m till och borrade allting.

## Pågående/påbörjade arbeten

Borrat, spräckt och rivit berg för vatten och avlopp, el fiber

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Spräckte alla hål. Gick väldigt tungt. Fick spräcka samma hål flera gånger uppifrån och ner. Rev vartefter med grävmaskinen. Kom ner ca 20-30cm bara. Skrapade av berget. Borrade igen. spräckte. Gick lika tungt denna gång. rev och kom ner på okej djup. Borrade sedan lite längre ner samt lite högre upp där vi spräckte innan. rev och kom ner på bra djup. Lastade bort berget. Flyttade bort allt material friggo och rör osv så vi kan gräva där. Skrapade av topp gruset på parkeringen. Grävde ner för den branta backen. Stötte på berg men det var löst sen sprängningen så fick bort det. Grävde fram till infarten på bra djup.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Awikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tillägsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder





Borrat, spräckt och rivit berg för vatten och avlopp, el fiber

---







Spräckte alla hål. Gick väldigt tungt. Fick spräcka samma hål flera gånger uppifrån och ner. Rev vartefter med grävmaskinen. Kom ner ca 20-30cm bara. Skrapade av berget. Borrade igen. spräckte. Gick lika tungt denna gång. rev och kom ner på okej djup. Borrade sedan lite längre ner samt lite högre upp där vi spräckte innan. rev och kom ner på bra djup. Lastade bort berget. Flyttade bort allt material friggo och rör osv så vi kan gräva där. Skrapade av topp gruset på parkeringen. Grävde ner för den branta backen. Stötte på berg men det var löst sen sprängningen så fick bort det. Grävde fram till infarten på bra djup.

## Pågående/påbörjade arbeten

Grävt upp schakt för dragnings, byggt frigolitlåda, fyllt igen över låda

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

grävde upp sista biten stötte inte på något mer berg där. Fyllde igen för infarten så vi kunde avetablerade borrh och spräckutrustningen. åkte ner och fyllde nerifrån och upp på va lådan. Fyllde så långt vi hade dragit. Fick in ett lass till med 0.8. Gjorde bädd sista biten för Bengt. Monterade botten och väggarna. Strippade klart värmekabeln på pem slangen.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten

## Awikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tilläggsarbeten


## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder



Grävt upp schakt för dragning, byggt frigolitlåda, fyllt igen över låda

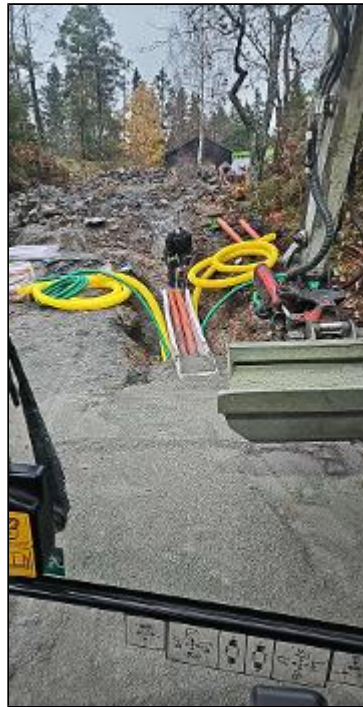







grävde upp sista biten stötte inte på något mer berg där. Fyllde igen för infarten så vi kunde avetablerade borrh och spräckutrustningen. åkte ner och fyllde nerifrån och upp på va lådan. Fyllde så långt vi hade dragit. Fick in ett lass till med 0.8. Gjorde bädd sista biten för Bengt. Monterade botten och väggarna. Strippade klart värmekabeln på pem slangen.

## Pågående/påbörjade arbeten

Monterat frigolitlåda, mont avlopp, el, fiber, värmekabel på vatten, fyllt igen med stenmjöl, förberett för väg

Skrivet av Christoffer Kuoppa (C.Sjögren Entreprenad AB)

Fortsatte med rör dragningen för VA till Bengt. La 08 sand i botten. la frigholit låda den smalare sista biten. monterade avloppsrör och avslutade med en spolbrunn. drog upp rör så man ser tydligt vart anslutningspunkten är. La ner pem 32 slangen. den räckte precis innanför Bengts tomtgräns. vi drog upp värmekabeln upp på spolbrunnen så den inte grävs sönder senare. Fick förlänga el och fiber röret med ca 4m. knöt ihop dragsnöret på fiber röret. Lämnade uppstick åvan mark. pluggade el och fiber röret. Fyllde klart för lådan med 08 stenmjölet. la locket på. fyllde sedan 10cm på locket med 0,8 stenmjöl. Fyllde sedan med beg massorna över och fyllde upp schaktet. Gjorde väg fram mot Tonys tomt. Fyllde sedan med sand i botten mot Tony. Drog upp rören fram till 90 böjen Lämnade skarvgrop där för el röret. Fyllde fast lådan med 0.8 stenmjöl. Fyllde sedan upp så långt vi kunde ca 5m sen tog stenmjölet slut. Snyggade då till marken för tegelhuset nedanför Begnts tomt samt hela vägen ner för backen till där vi har påbörjat för vägen. Klippte av lite grenar mot tegelhuset som hängde ut över nya vägen. Drog sedan upp fiberduk. parkerade bakom duken med grävaren. Inväntar lastbil med bärlager och 500kg padda till på måndag.

Fettade och servade maskinen lite.

Skrivet av Björn Östlund (C.Sjögren Entreprenad AB)

## Avslutade arbeten


## Avvikelser / Störningar / Hinder

## Ändringar och tillägsarbeten

## Närvarotid

Namn	Ordinarie tid
Björn Östlund	8
Christoffer Kuoppa	8
Totalt:	16

## Bilder

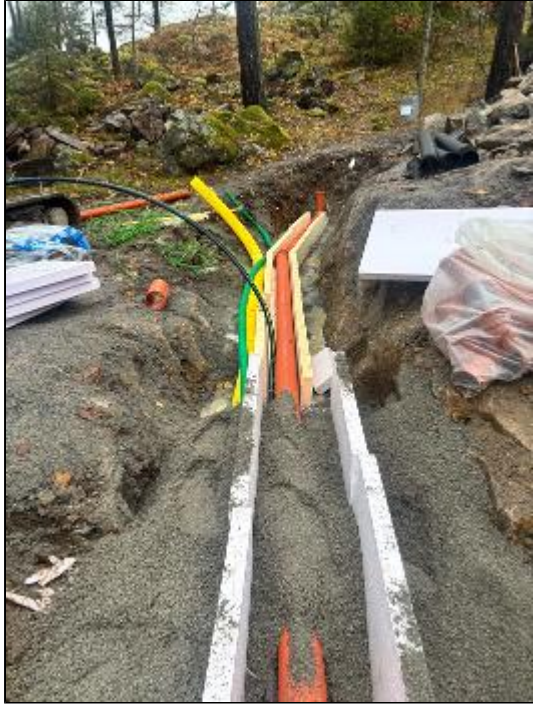



Monterat frigolitlåda, mont avlopp, el, fiber, värmekabel på vatten, fyllt igen med stensmjöl, förberett för väg

---









Fortsatte med rör dragningen för VA till Bengt. La 08 sand i botten. la frigholit låda den smalare sista biten. monterade avloppsrör och avslutade med en spolbrunn. drog upp rör så man ser tydligt vart anslutningspunkten är. La ner pem 32 slangen. den räckte precis innanför Bengts tomtgräns. vi drog upp värmekabeln upp på spolbrunnen så den inte grävs sönder senare. Fick förlänga el och fiber röret med ca 4m. knöt ihop dragsnöret på fiber röret. Lämnade uppstick åvan mark. pluggade el och fiber röret. Fyllde klart för lådan med 08 stenmjölet. la locket på. fyllde sedan 10cm på locket med 0,8 stenmjöl. Fyllde sedan med beg massorna över och fyllde upp schaktet. Gjorde väg fram mot Tonys tomt. Fyllde sedan med sand i botten mot Tony. Drog upp rören fram till 90 böjen Lämnade skarvgrop där för el röret. Fyllde fast lådan med 0.8 stenmjöl. Fyllde sedan upp så långt vi kunde ca 5m sen tog stenmjölet slut. Snyggade då till marken för tegelhuset nedanför Begnts tomt samt hela vägen ner för backen till där vi har påbörjat för vägen. Klippte av lite grenar mot tegelhuset som hängde ut över nya vägen. Drog sedan upp fiberduk. parkerade bakom duken med grävaren. Inväntar lastbil med bärlager och 500kg padda till på måndag. Fettade och servade maskinen lite.
